Nome attività	Durata
Recinzione e apprestamenti del cantiere	243 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	240 g
Rimozioni e demolizioni	17 g
Rimozione di segnaletica verticale	1 g
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici	4 g
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	4 g
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	4 g
Scavo a sezione obbligata	4 g
Pali trivellati	24 g
Posa ferri di armatura per pali trivellati	6 g
Perforazioni per pali trivellati	16 g
Getto di calcestruzzo per pali trivellati	15 g
Ponte	60 g
Scavo di sbancamento in terreni incoerenti	5 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	6 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazi	5 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	3 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	10 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazic	5 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1 g
Muri di sostegno	24 g
Scavo a sezione obbligata	4 g
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.	10 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.	6 g
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.	4 g
Sistemazioni idrauliche e opere d'arte	58 g
Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti	24 g
Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giun	18 g
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	18 g
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori strad	6 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori s	8 g
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	4 g
Cordoli, zanelle e opere d'arte	5 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	3 g
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	2 g
Posa di biostuoia	3 g
VASCHE IN C.A.	9 g
Scavo di splateamento	2 g
Montaggio di monoblocco prefabbricato in c.a.	2 g
Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a.	2 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a.	2 g
Getto in calcestruzzo per vasca in c.a.	1 g
Sede stradale	50 g
Asportazione di strato di usura e collegamento	2 g
Scavo a sezione obbligata	4 g
Formazione di rilevato stradale	11 g
Formazione di fondazione stradale	8 g
Formazione di manto di usura e collegamento	4 g
Isola centrale	27 g
Posa di cavidotto	10 g
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	2 g
Realizzazione di marciapiedi	8 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1 g
Posa di pavimenti per esterni in masselli	6 g
Segnaletica	7 g
Posa di segnaletica verticale	3 g
Realizzazione di segnaletica orizzontale	4 g
Barriere di sicurezza	13 g
Posa di ringhiere e parapetti	1 g
Montaggio di guard-rails	12 g
Pubblica illuminazione	13 g
Posa di conduttura elettrica	3 g
Posa di pali per pubblica illuminazione	7 g
Montaggio di apparecchi illuminanti	3 g
Smobilizzo del cantiere	6 g
Pulizia generale dell'area di cantiere	2 g
Pulizia di sede stradale	2 g
Smobilizzo del cantiere	2 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = ZONA UNICA	

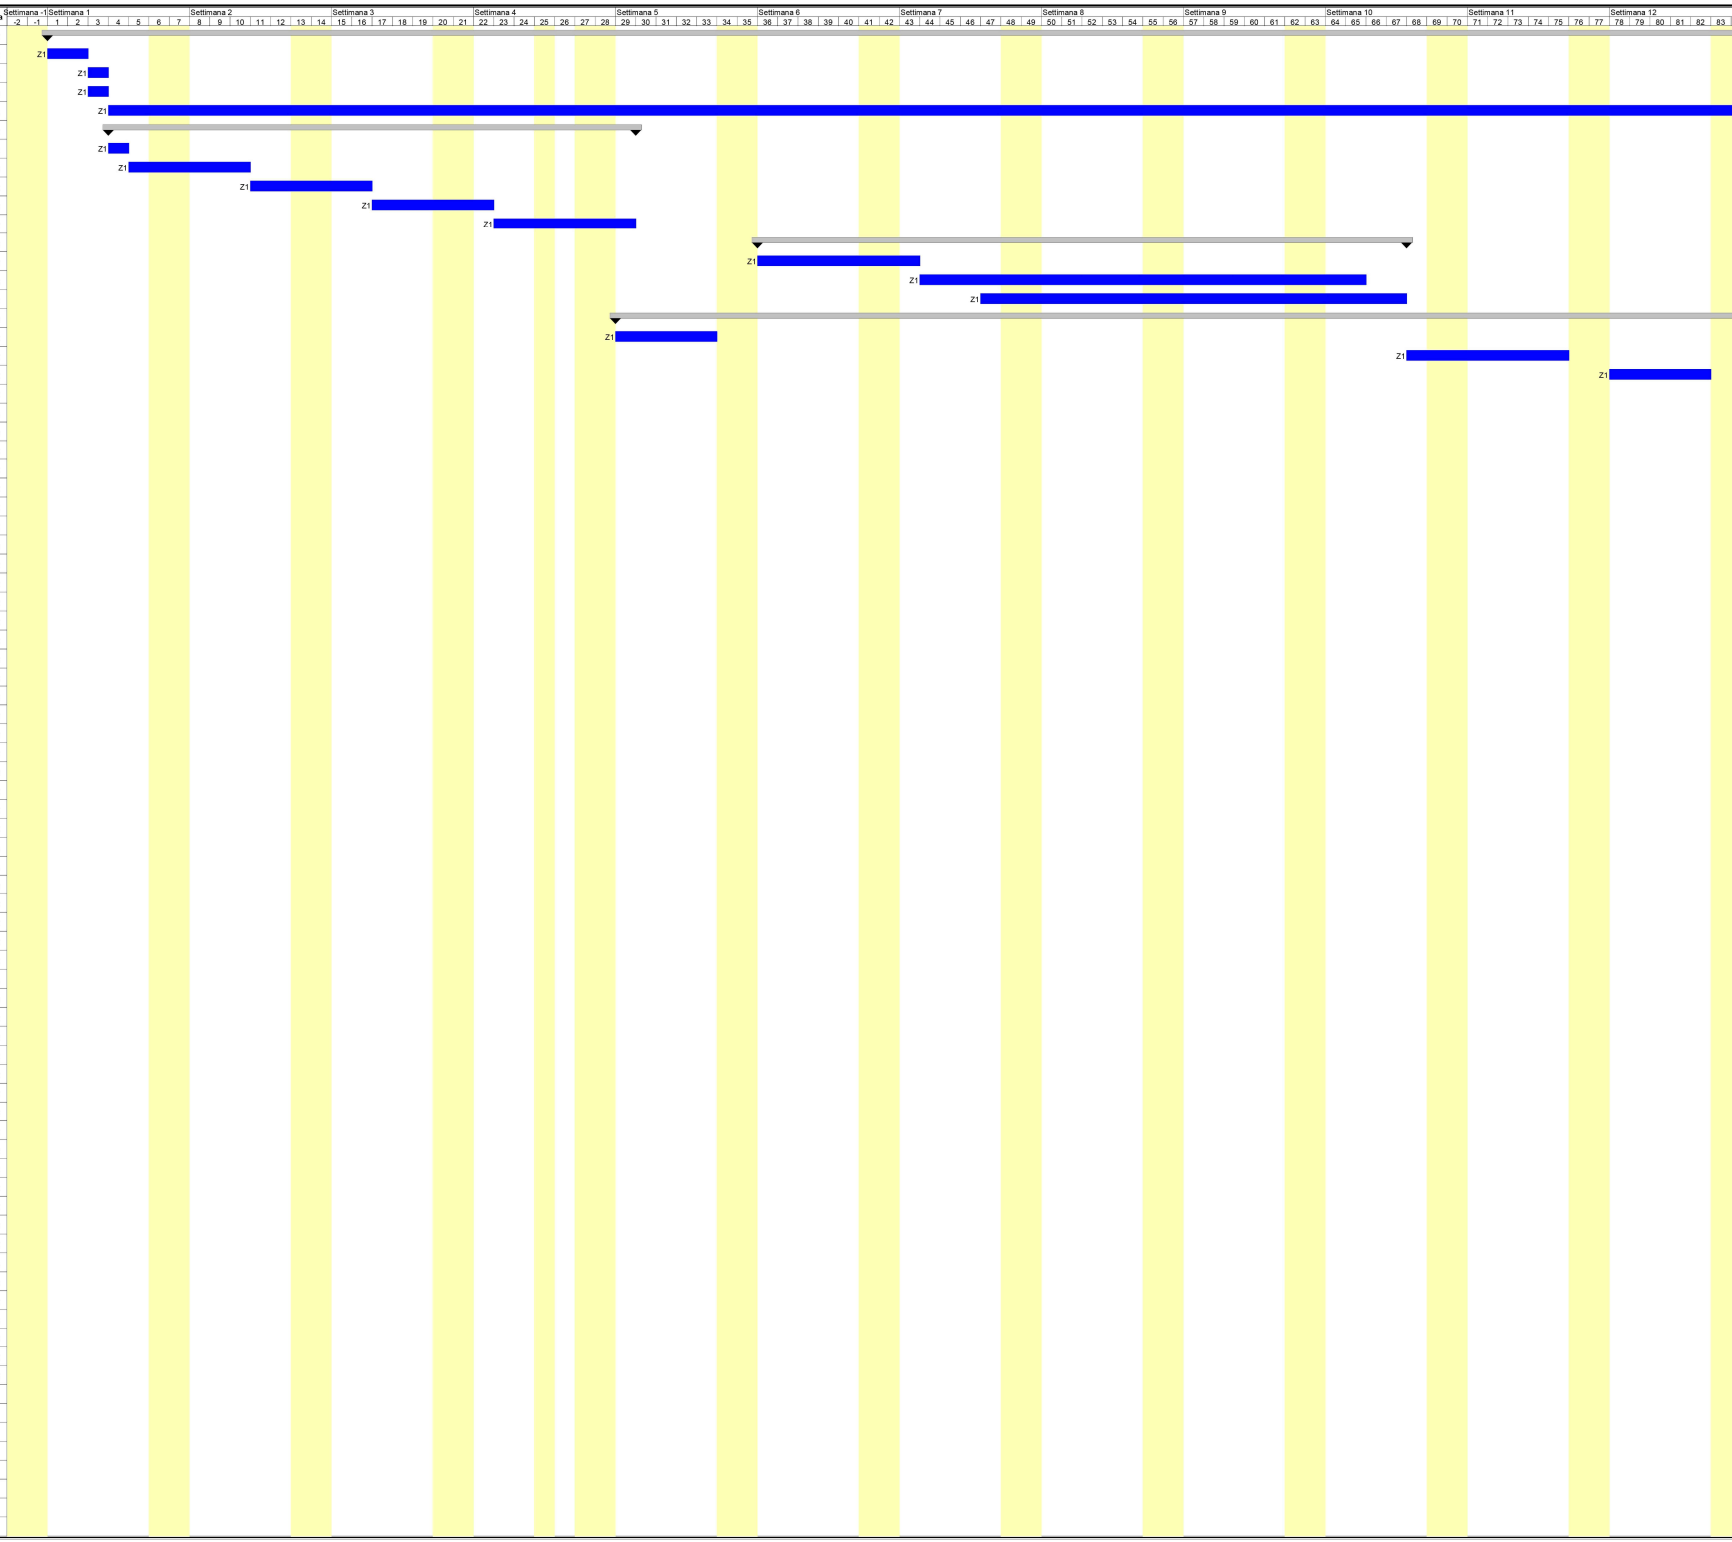

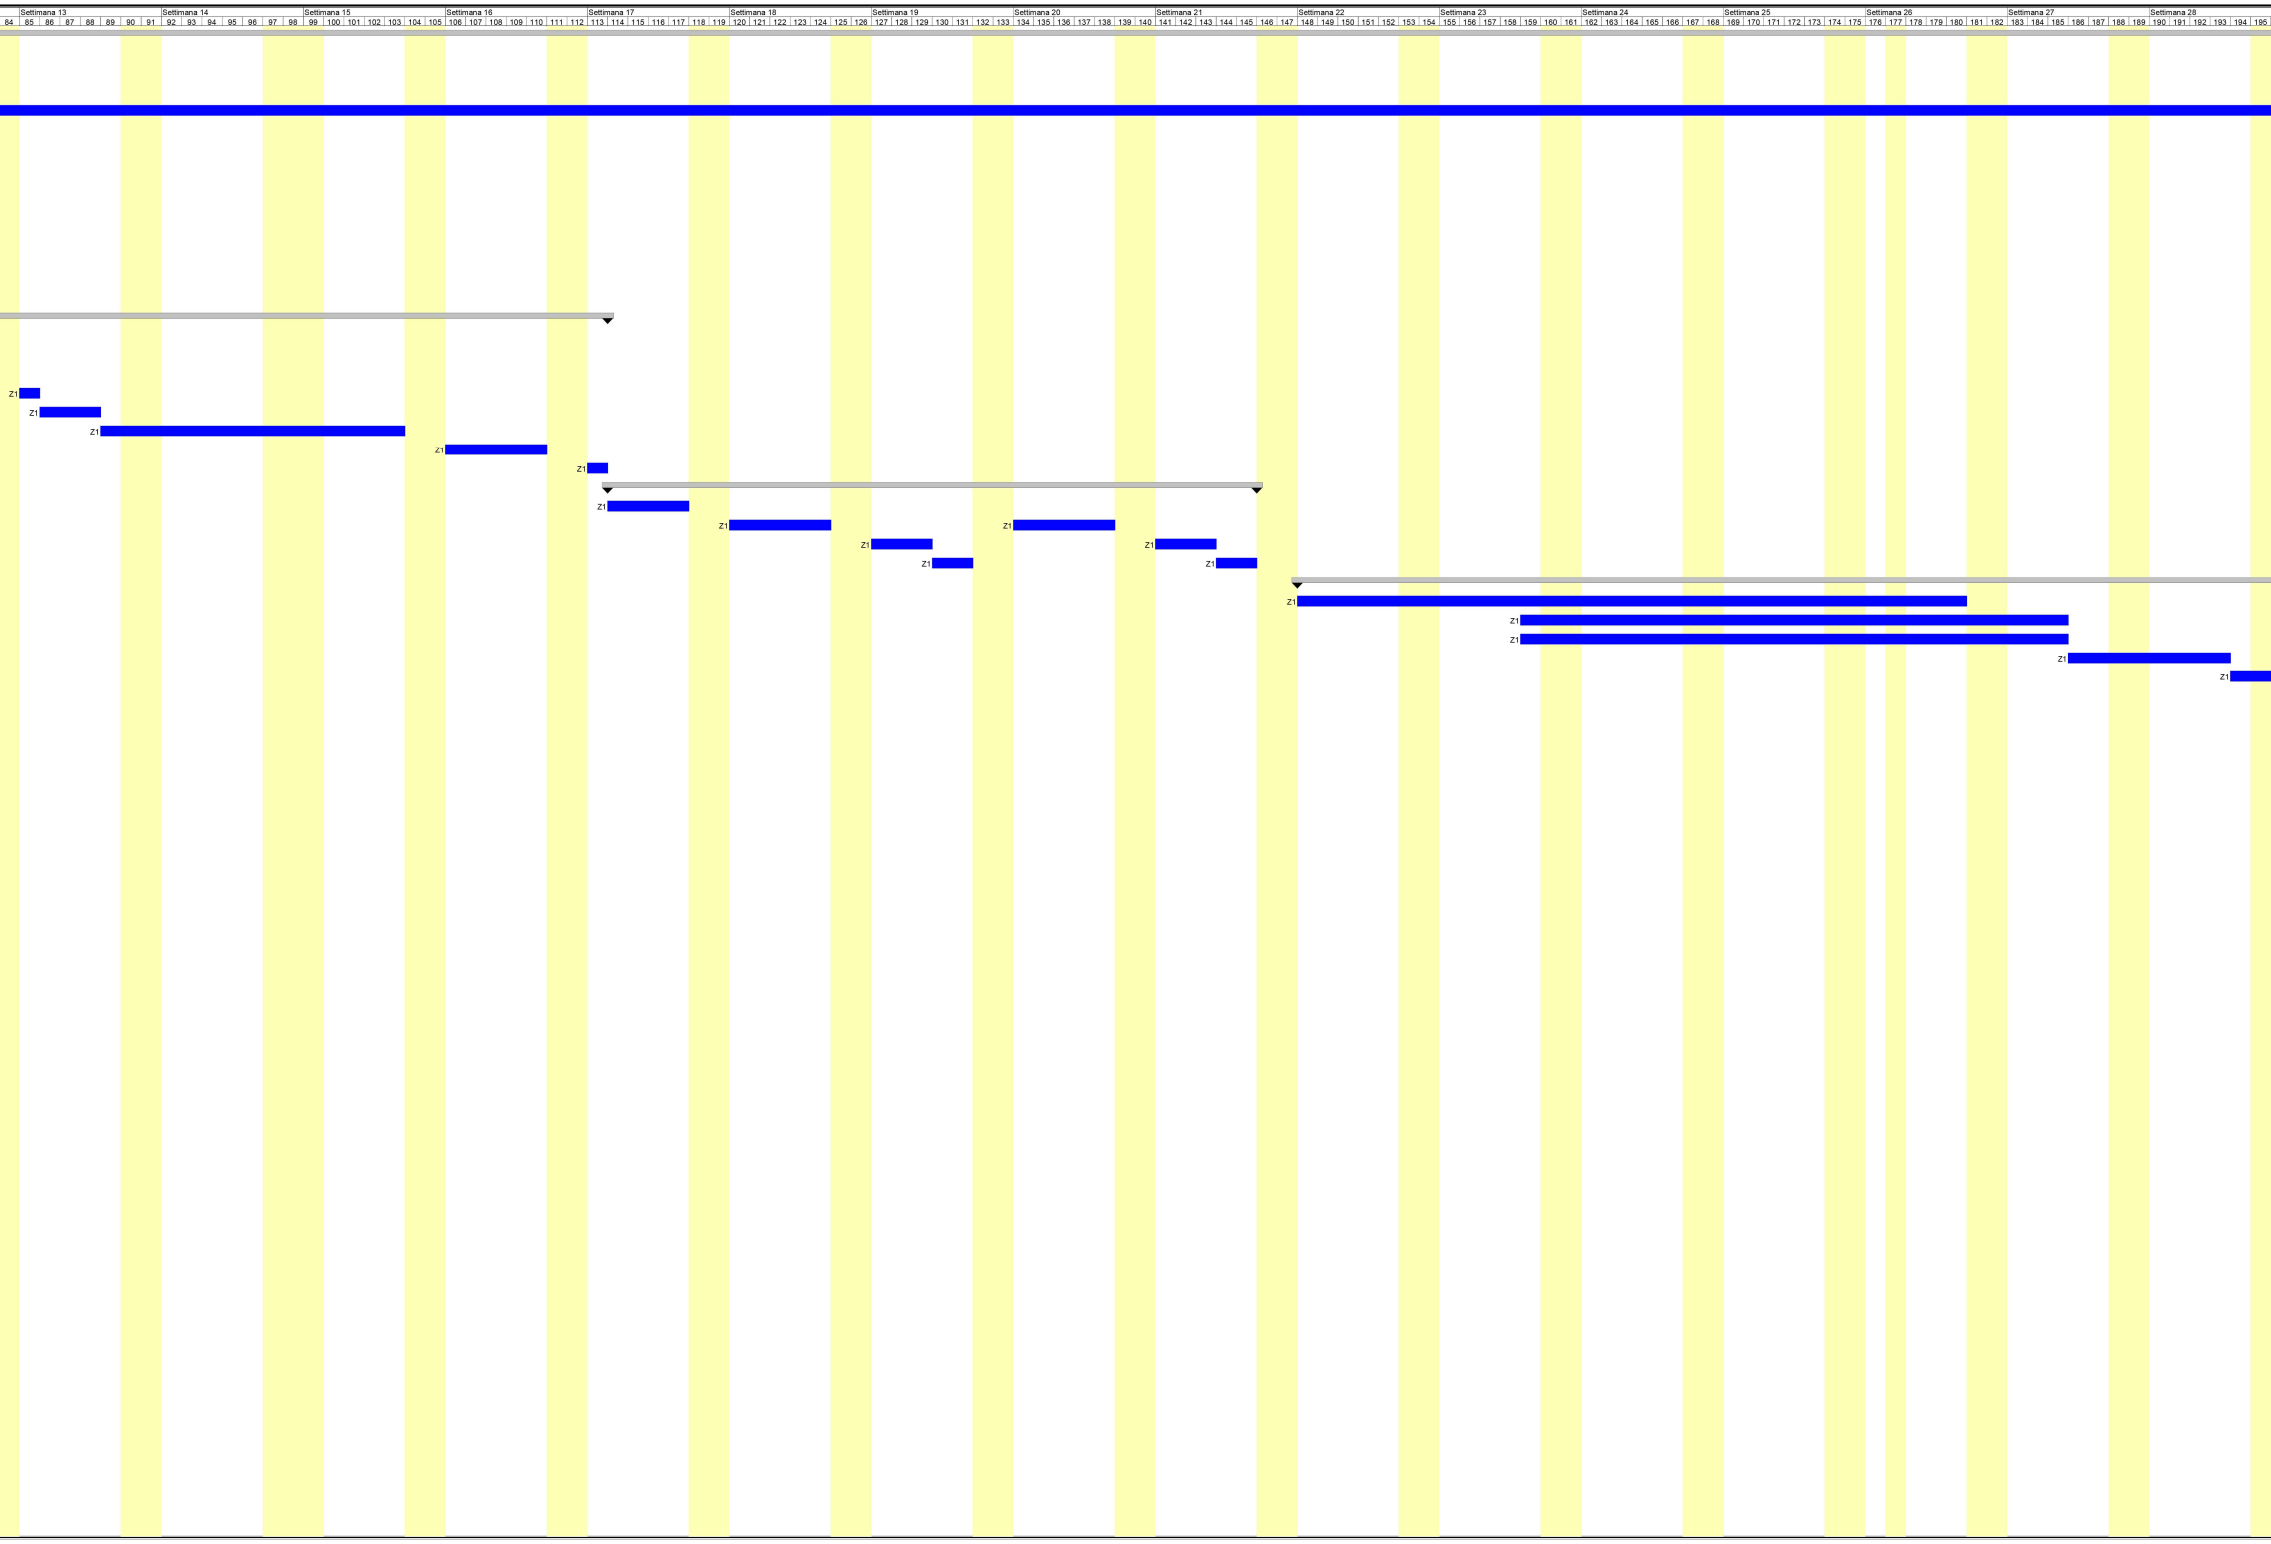

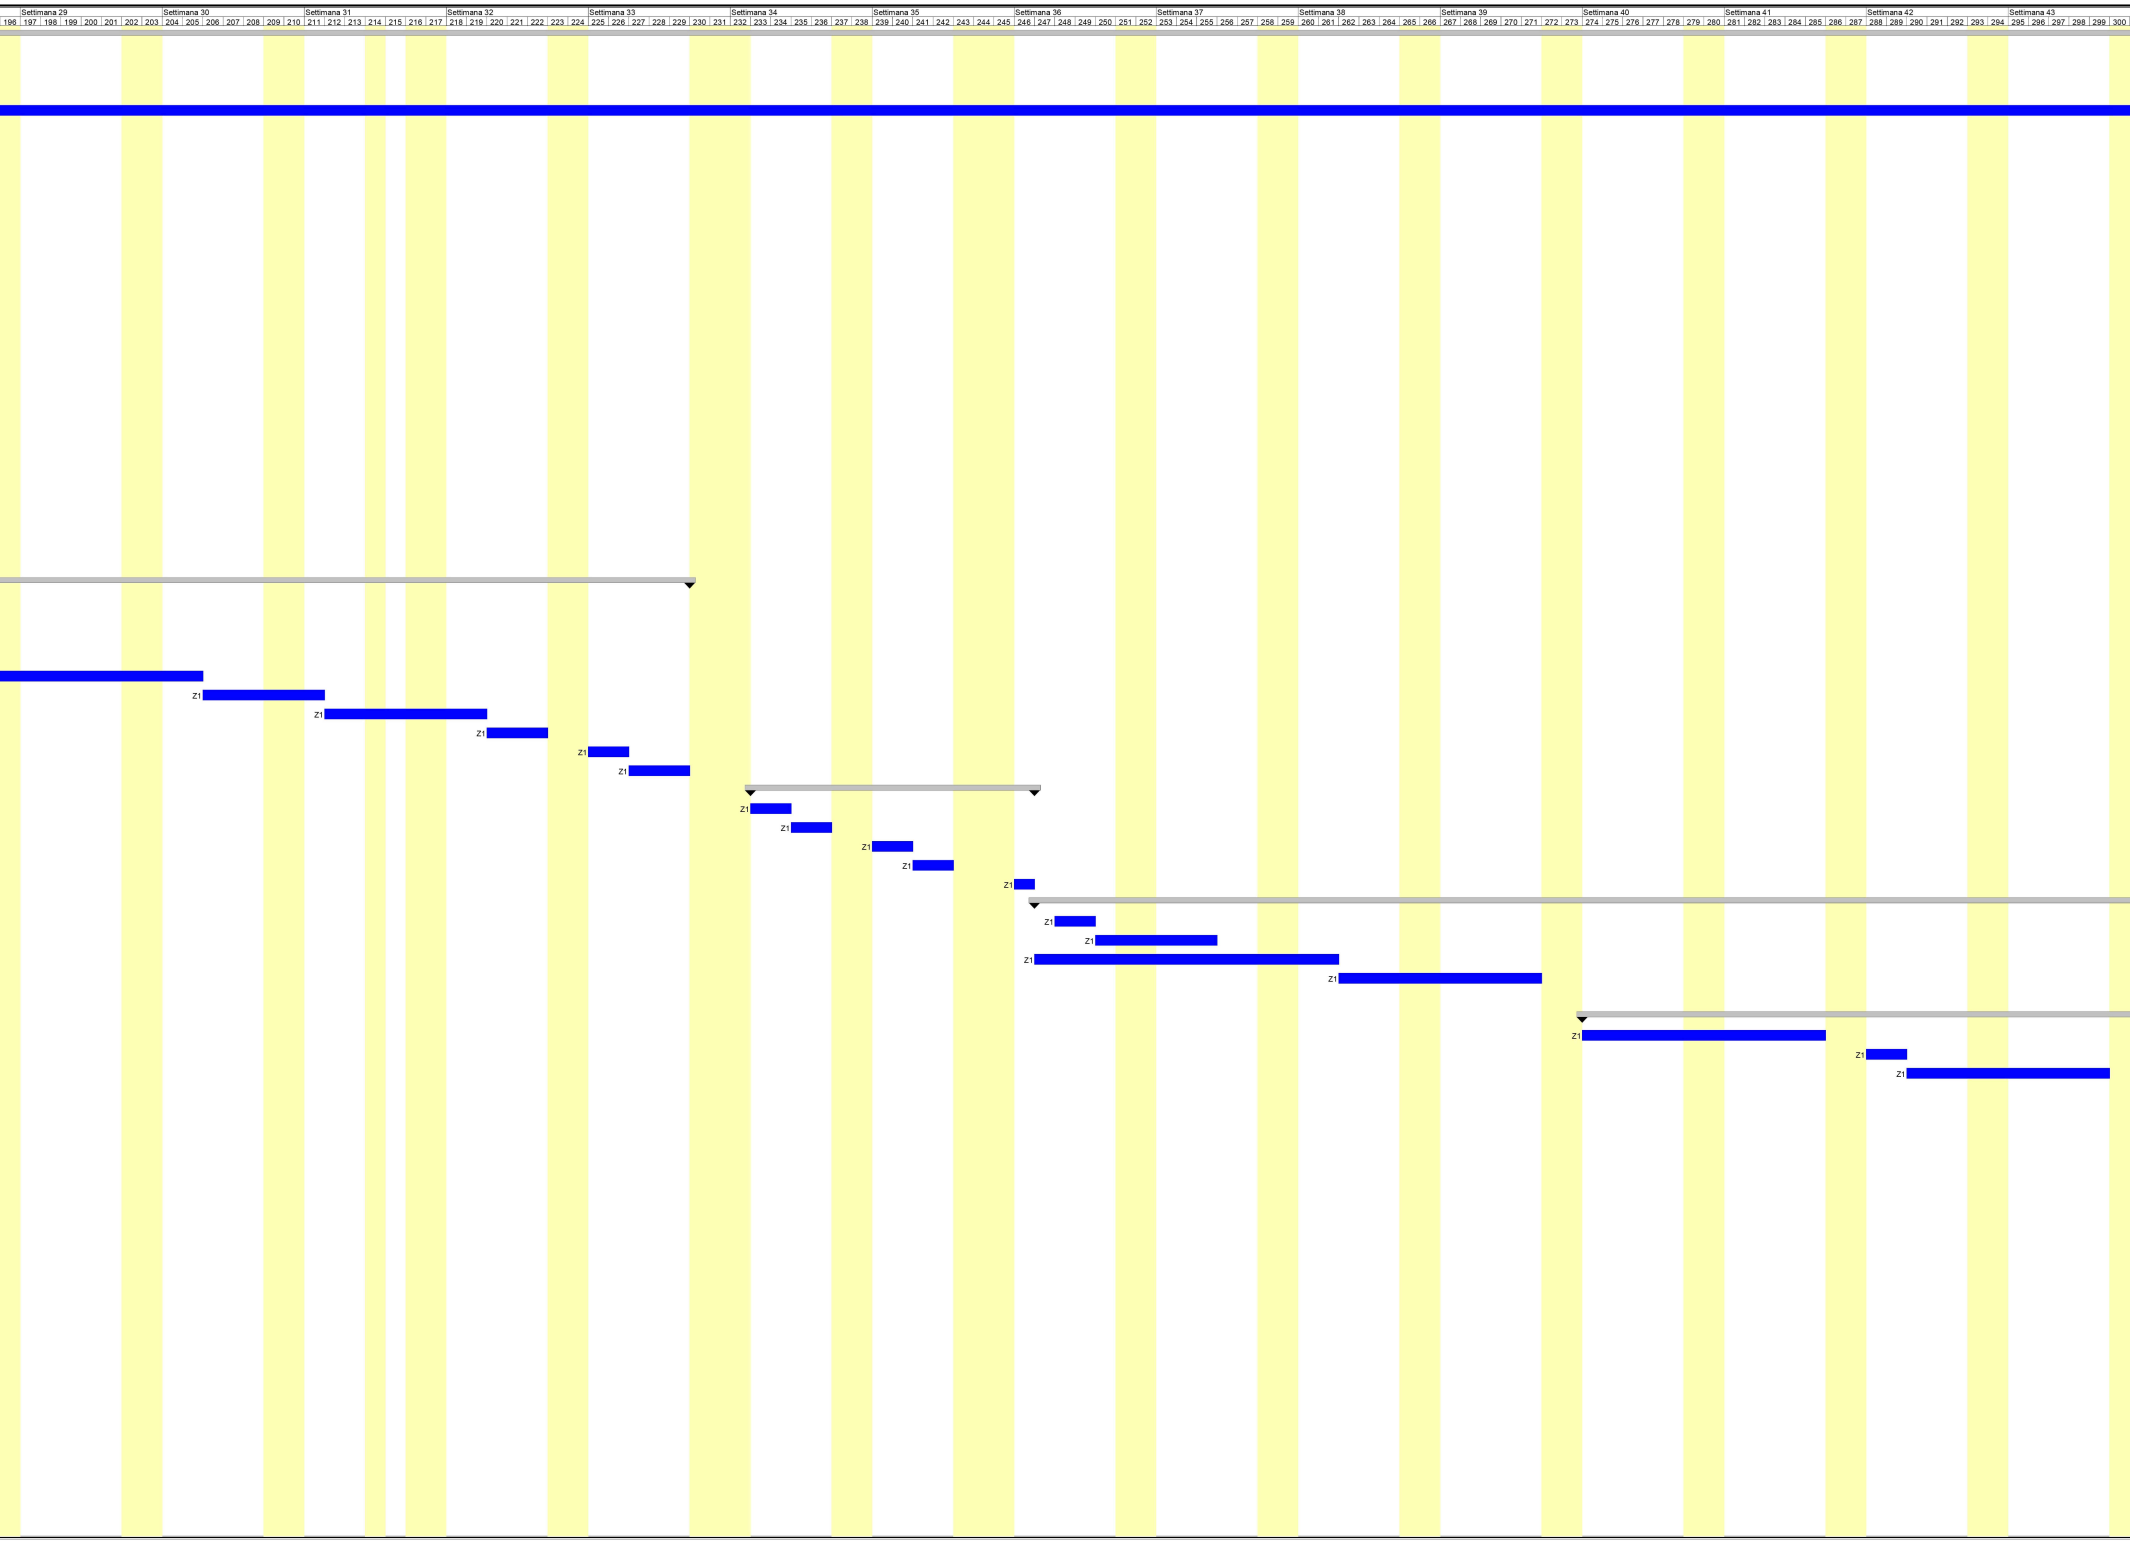

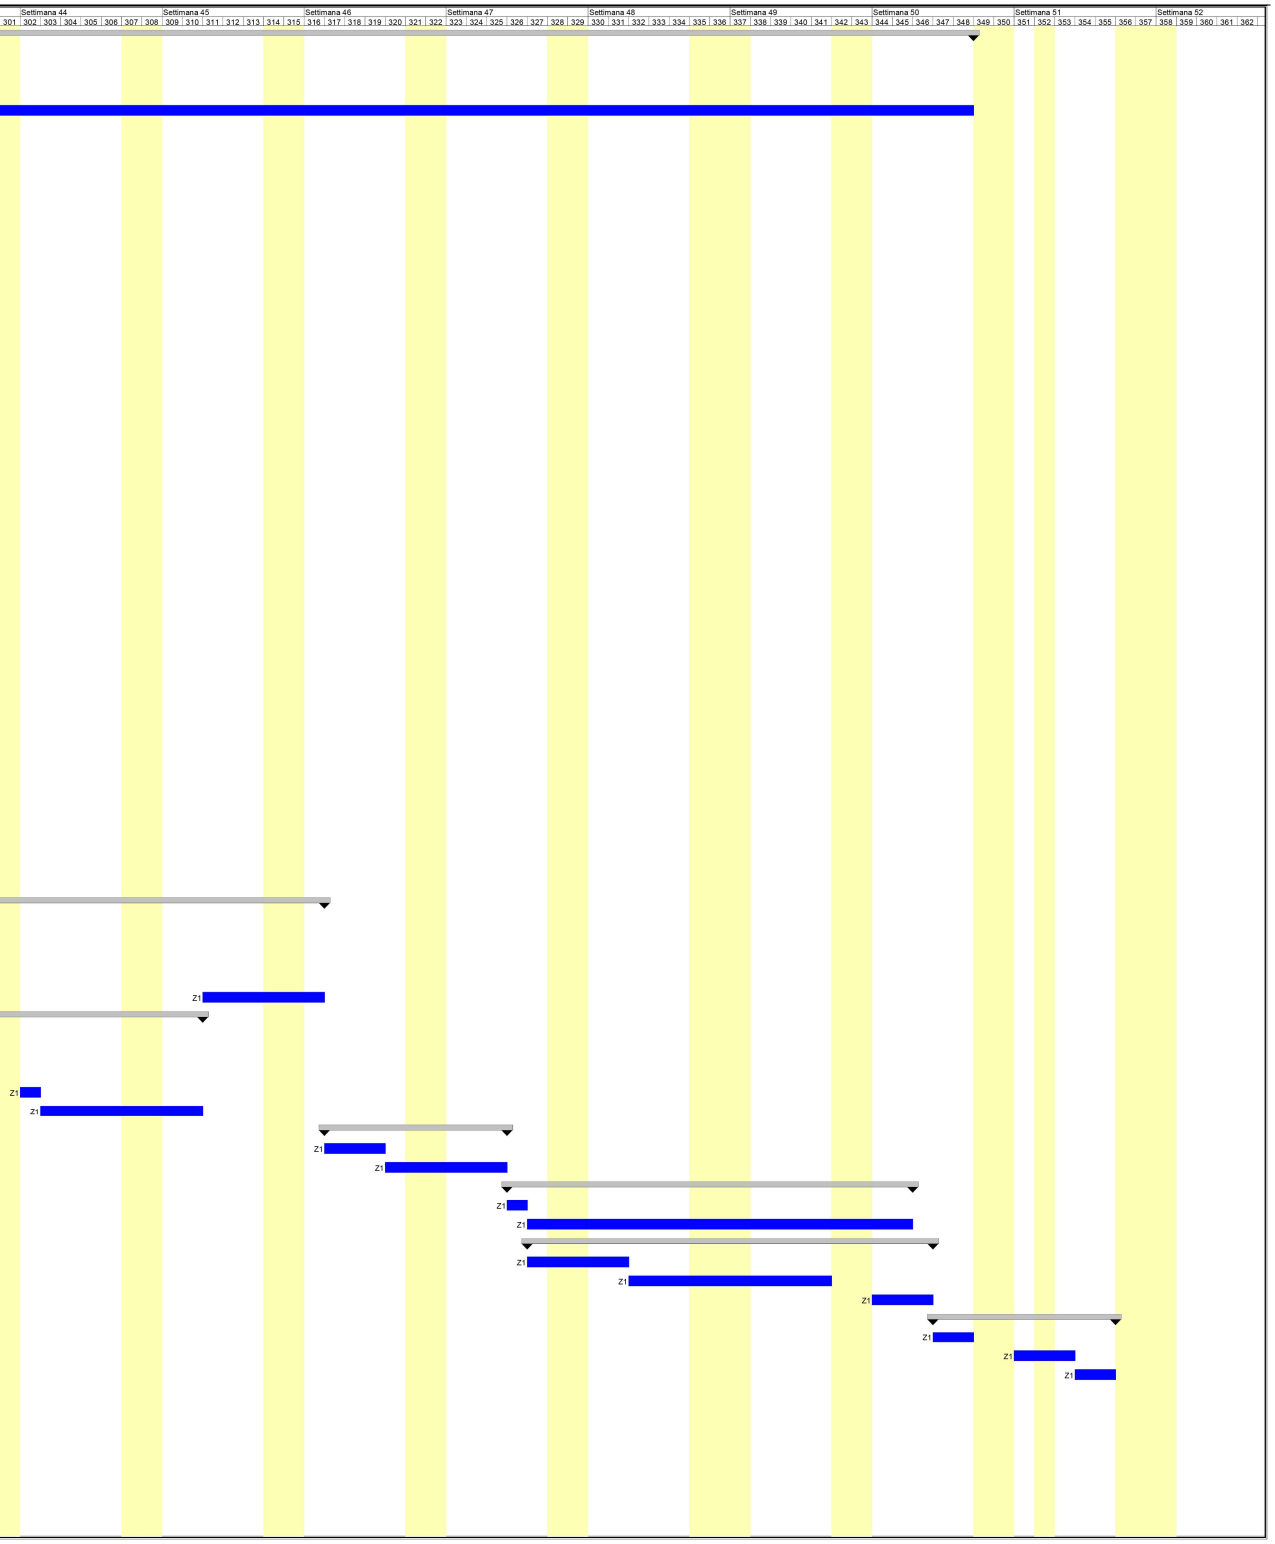

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

- UFFICIO TECNICO -

SETTORE VIABILITA' - LOGISTICA E PROTEZIONE CIVILE

S.P. 20 "MARRUVIANA" - LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO TRATTO COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI / INCROCIO CINTARELLA

PROGETTO DEFINITIVO

Il Progettista
Ing. Giuseppe Pace

eta consult s.r.l.
servizi di ingegneria
strada statale 17 KM 43+200
L'AQUILA (AQ)

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Angela Ghizzoni

Visto Il Dirigente
Ing. Nicolino D'Amico

OPERA
SICUREZZA

TAVOLA
ALLEGATO "A" AL PSC
DIAGRAMMA DI GANTT

ALLEGATO
PSC2

SCALA

DATA
Ottobre 2022

Aggiornamenti		
Mod.	Data	
Rev. 0		
Rev. 1		
