
Nome attività	Durata
INTERVENTO N°1 (Strada Regionale 602 KM 11+350)	85 g
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli im	1 g
Perforazioni per la posa di tiranti su pareti rocciose	16 g
Posa di reti e cavi d'acciaio per la stabilizzazione di pareti rocciose	33 g
Disgaggio di porzioni di roccia instabili	38 g
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti	22 g
Prove	17 g
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	7 g
Pulizia di sede stradale	2 g
INTERVENTO N°2 (Strada Regionale 602 KM 8+500 8+900)	53 g
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	4 g
Rimozione di guard-rails	17 g
Montaggio di guard-rails	23 g
Realizzazione di segnaletica orizzontale	10 g
Pulizia di sede stradale	4 g
INTERVENTO N°3 (Strada Provinciale 7, Km 21+500)	16 g
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g
Disgaggio di porzioni di roccia instabili	5 g
Manutenzione della rete paramassi esistente	13 g
Pulizia di sede stradale	4 g
INTERVENTO N°4 (Strada Regionale 17 bis, Km 59+000)	18 g
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g
Rimozione rete paramassi esistente	11 g
Posa di reti e cavi d'acciaio per la stabilizzazione di pareti rocciose	10 g
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	7 g
Pulizia di sede stradale	3 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = BASE	
Z2 = INTERVENTO N°1 (Strada Regionale 602 KM 11+350)	
Z3 = INTERVENTO N°2 (Strada Regionale 602 KM 8+500 8+900)	
Z4 = INTERVENTO N°3 (Strada Provinciale 7, Km 21+500)	
Z5 = INTERVENTO N°4 (Strada Regionale 17 bis, Km 59+000)	

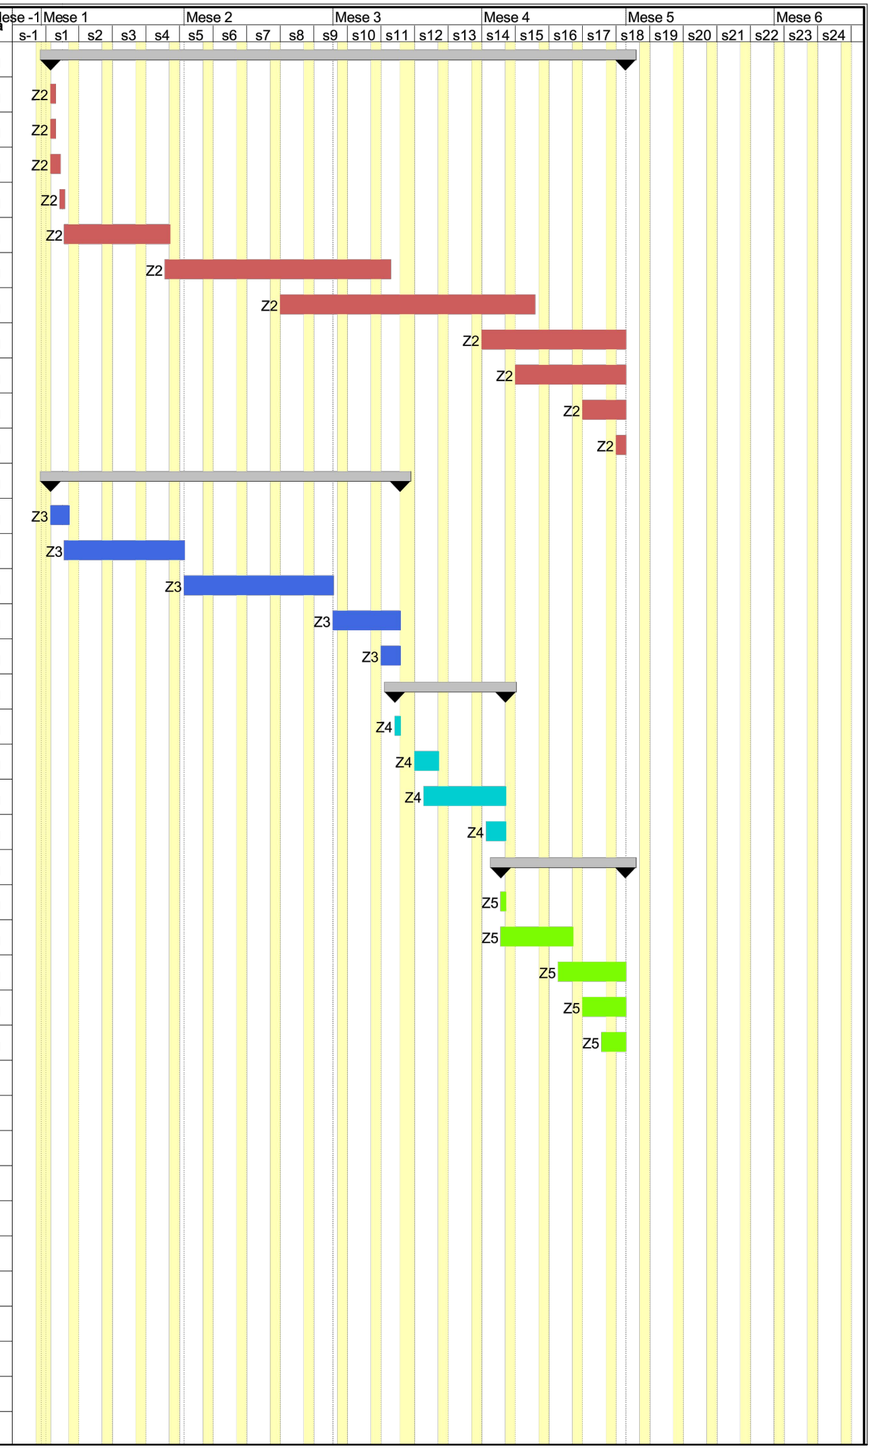

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

- UFFICIO TECNICO -

SETTORE VIABILITA' - LOGISTICA E PROTEZIONE CIVILE

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E DI RIORDINO GENERALE SULLE SS.RR. E SULLE SS.PP. RICOMPRESE NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASTEL DEL MONTE, SANTO STEFANO DI SESSANIO, CASTELVECCHIO CALVISIO, CARAPELLE CALVISIO, SAN PIO DELLE CAMERE, VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI E CALASCIO (AQ)

PROGETTO ESECUTIVO

Il Progettista Ing. Giuseppe Pace	Il Responsabile del Procedimento Ing. Angela Ghizzoni
	Visto Il Dirigente Ing. Nicolino D'Amico

Opera SICUREZZA	Allegato SI02
Tavola ALLEGATO "A" AL PSC DIAGRAMMA DI GANTT	Scala

Aggiornamenti			Data
Mod.	Data		Giugno 2025
Rev. 0			
Rev. 1			
