Firmato digitalmente da SALVATORE PETRILLI
C: IT

STUDIO PETRILLI
ARCHITETTURA - INGEGNERIA -URBANISTICA

Amministrazione Provinciale dell'Aquila

Settore Viabilità

Via Giuseppe Saragat - Loc. Campo di Pile (AQ) Tel 0862/405504 Fax 0862/25104 Cod. Fisc. 80002370668

PROGETTO: S.R. 479 "SANNITE": DM 125/2022 CONSOLIDAMENTO PONTE IN LOCALITA' BOCCA DI PANTANO, NEL COMUNE DI SCANNO (AQ), KM 43+700 (0145.V2.AQ) CUP: F97H23001790001

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale dell'Aquila

PROGETTO ESECUTIVO

elaborato:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Tavola:	**CP**
Rev:	
Scala:	
Data:	

Autorizzazioni:


Il Tecnico Incaricato

Arch. Salvatore Petrilli


via Montesanto n.37/a 67039 Sulmona (Aq) tel./fax 0864/55399
Email: studio.petrilli.s@gmail.com - PEC: salvatore.petrilli@archiworldpec.it

Firmato digitalmente
da SALVATORE
PETRILLI
C: IT

Nome attività	Durata
Preparazione delle aree di cantiere	7 g
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	4 g
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	3 g
Recinzione e apprestamenti del cantiere	7 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g
Montaggio del ponteggio metallico fisso	4 g
Impianti di servizio del cantiere	3 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferic	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Rimozione di rivestimenti	10 g
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	5 g
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a manc	5 g
Murature	13 g
Scarnitura di vecchie malte ammalorate	4 g
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura	5 g
Scuci e cuci	4 g
Iniezioni di miscele cementizie	11 g
Perforazioni in elementi opachi	6 g
Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementiz	5 g
Consolidamento strutture in c.a.	24 g
Consolidamento struttura in c.a. con applicazione di rete in ca	8 g
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici	2 g
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	5 g
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con c	2 g
Formazione intonaci esterni industrializzati	3 g
Tinteggiatura di superfici esterne	4 g
Smobilizzo del cantiere	7 g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	3 g
Smobilizzo del cantiere	4 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = ZONA UNICA	

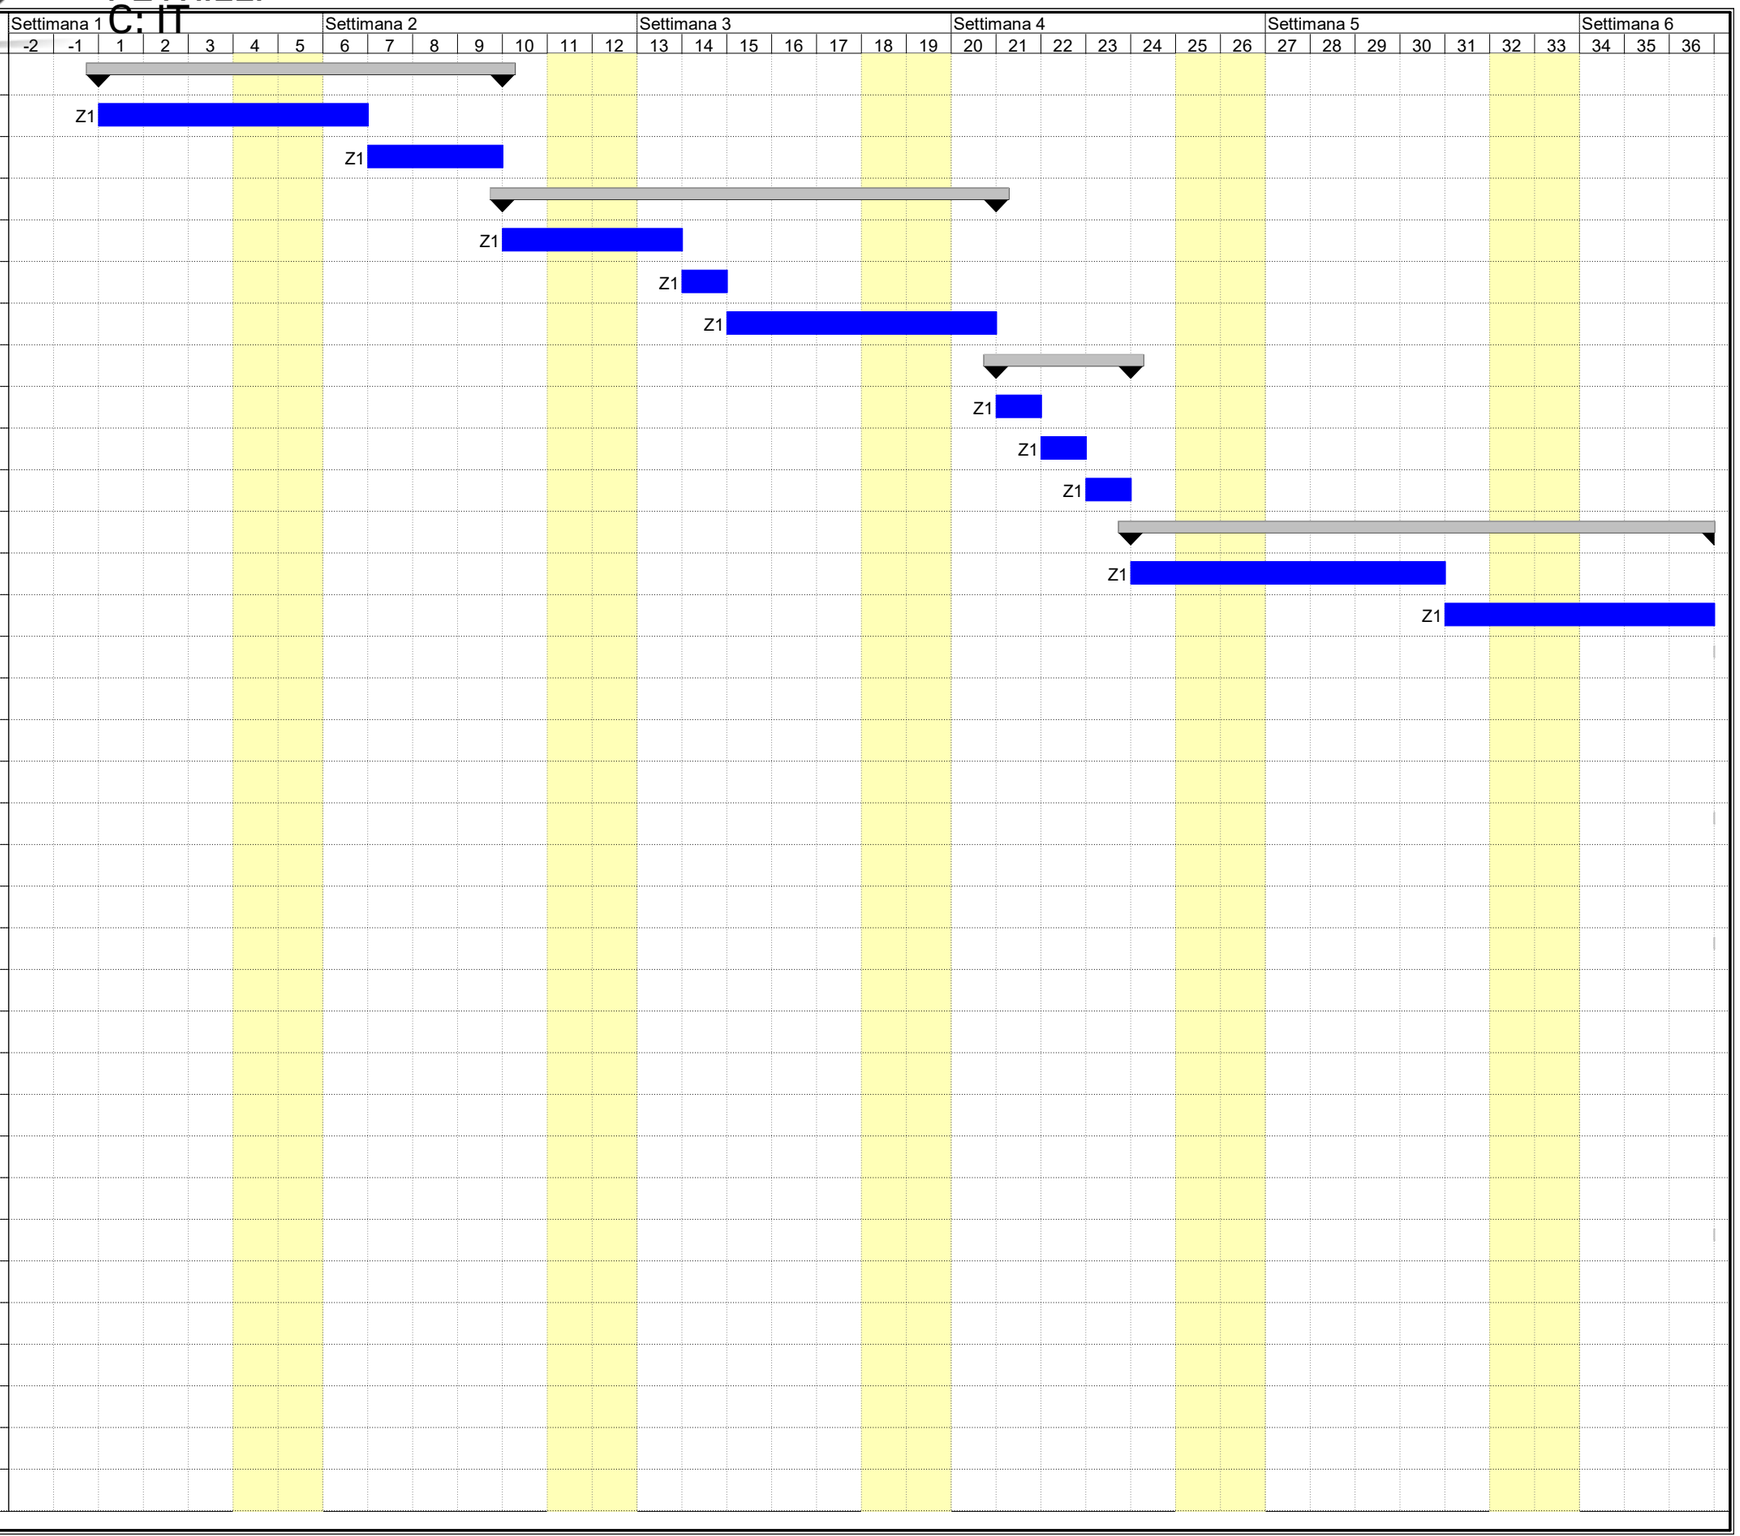

Firmato digitalmente
da SALVATORE
PETRILLI
C: IT

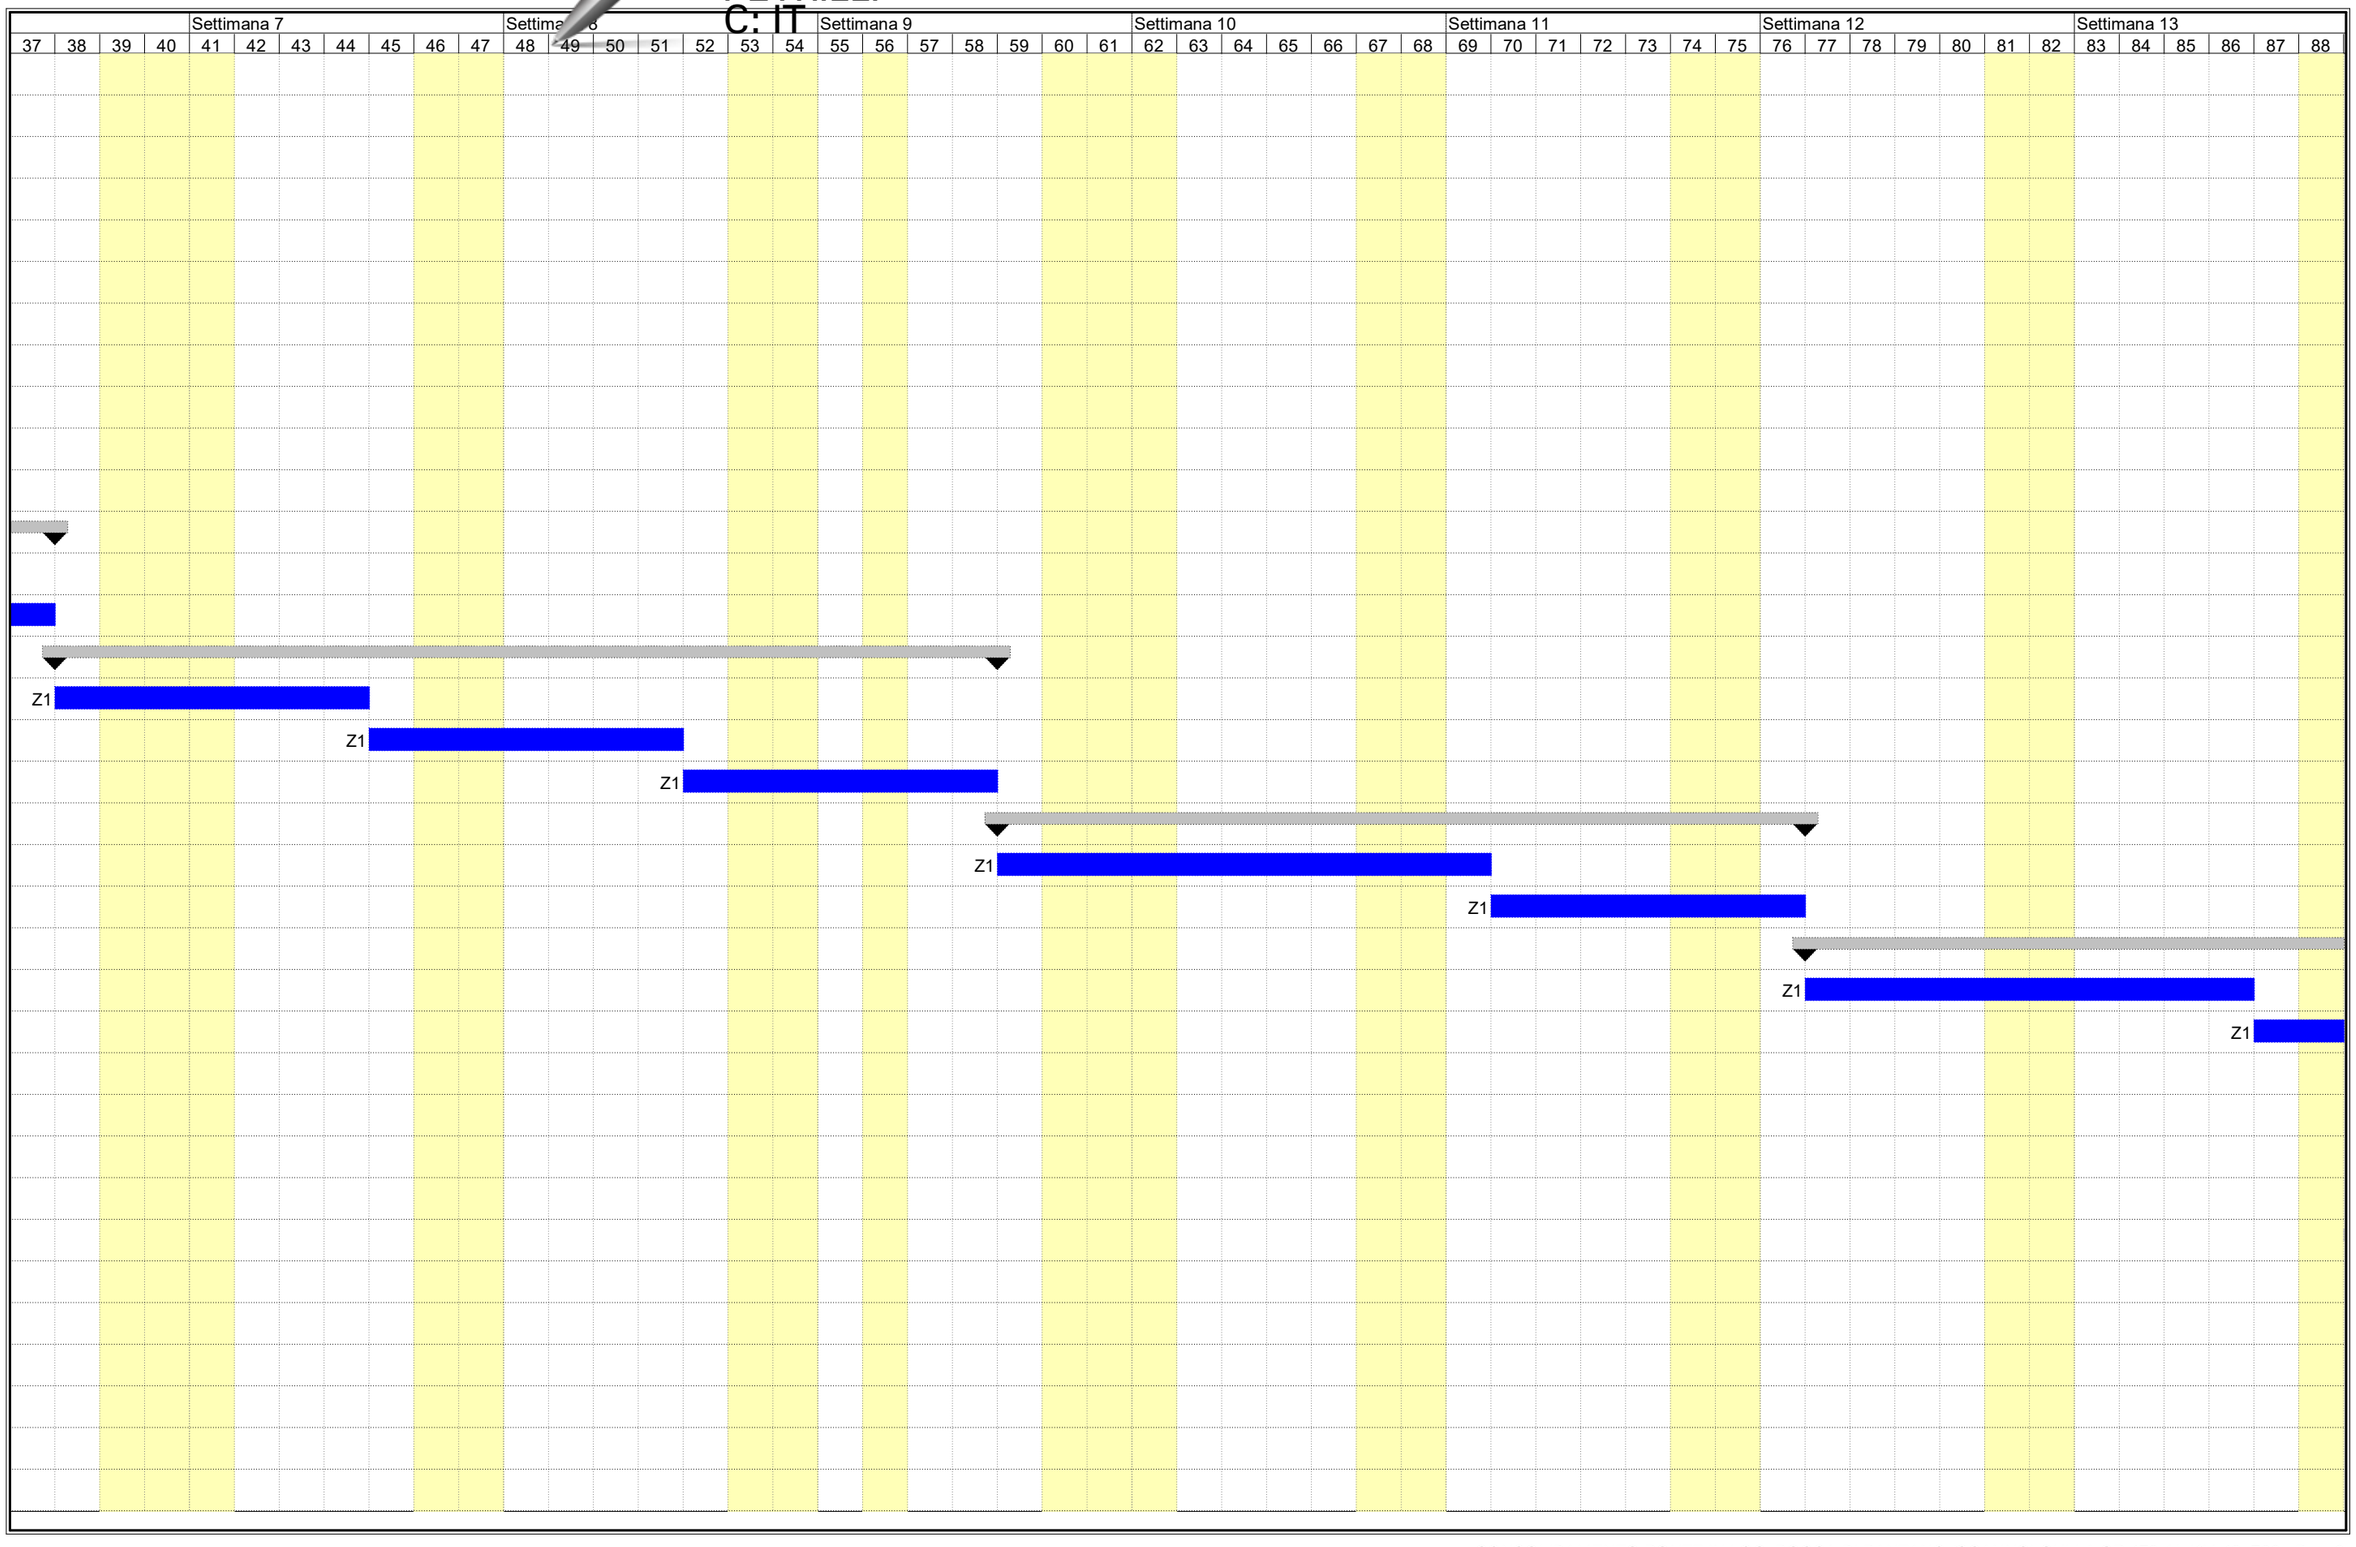

Firmato digitalmente
da SALVATORE
PETRILLI
C: IT

	Settimana 14							Settimana 15							Settimana 16							Settimana 17							Settimana 18							Settimana 19							Settimana 20							Settimana 2
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140

